


PŮDORYS 1:500

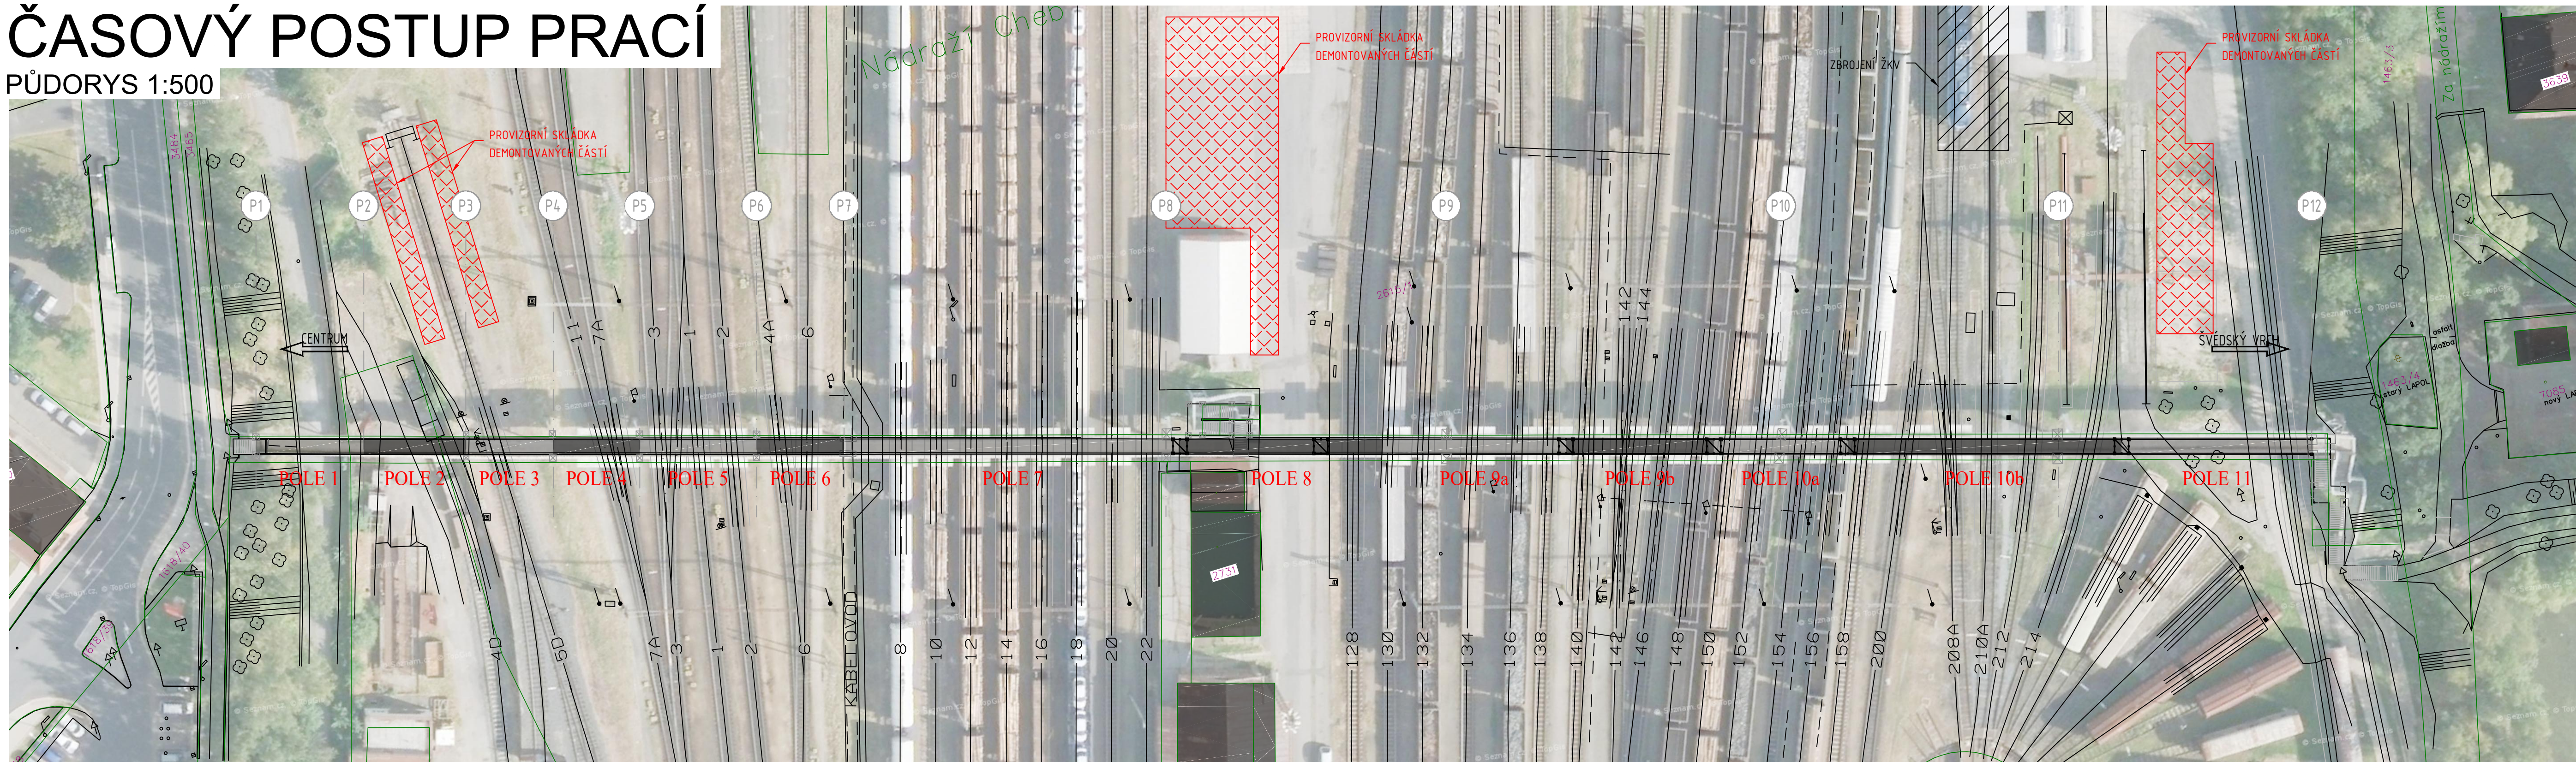

HARMONOGRAM VÝLUK - GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FÁZÍ DEMONTÁŽE LÁVKY

			SKLAD		Osobní kolejiště						Vjezdové kolejiště								Hlavní třídicí kolejiště																		Kolejiště loko depa						POZNÁMKA																	
DOBA TRVÁNÍ FÁZE [DNY]		4d	5d	11	9a	7a	3	1	2	4a	6	8	10	12	14	16	18	20	22	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	200	208a	210a	212	214		218	ČÍSLO KOLEJE																	
DATUM		VÝLUKY KOLEJÍ PRO FÁZE DEMONTÁŽE LÁVKY																												VÝLUKY KOLEJÍ PRO FÁZE DEMONTÁŽE LÁVKY																														
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	26.2.2018 - 2.3.2018	5																																																										
FÁZE 1	5.3.2018	1	5.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)																																																									
FÁZE 2	6.3.2018	1	6.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)																																																									
FÁZE 3	7.3.2018	1	7.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)																																																									
FÁZE 4	8.3.2018	1	8.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)																																																									
FÁZE 5	9.3.2018	1	9.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)																																																									
FÁZE 6	10.3.2018	1	10.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)																																																									
FÁZE 7	12.3.2018 - 14.3.2018	3																			14.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)																																							
FÁZE 8	15.3.2018 - 17.3.2018	3											15.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)								FÁZE 8					16.3.2018: 00:00-23:59 (24h)																																		
FÁZE 9	18.3.2017	1											16.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)													17.3.2018: 00:00-23:59 (24h)																																		
FÁZE 10	19.3.2018 - 20.3.2018	2																																																										
FÁZE 11	21.3.2018 - 22.3.2018	2																																																										
FÁZE 12	23.3.2018	1																																																										
FÁZE 13	24.3.2018 - 28.3.2018	4																																																										
CELKEM DOBA TRVÁNÍ DEMONTÁŽE [DNY] :		27																																																										

Popis rozsahu výluky kolejí v osobním kolejišti: (výluky tzv. Lipovského zhlaví)	4d	od návěstidla Se311 až po konec koleje v žkm 454.701
	5d	od návěstidla Se311 až po konec koleje v žkm 454.748
	11	od návěstidla Se27 až po návěstidlo S11
	9a	od návěstidla Se27 až po návěstidlo S9a
	7a	od návěstidla Se27 až po návěstidlo Lc7a
	3	od návěstidla Se23 až po návěstidlo L3
	1	od návěstidla Se20 až po návěstidlo S1
	2	od návěstidla Se26 až po návěstidlo S2
	4a	od návěstidla Se26 až po konec koleje v žkm 454.887
	6	od návěstidla Se26 až po návěstidlo L6

Pozn. Uvedené termíny výluk jsou předpokládáné termíny platné v době vydání dokumentace.
V případě změny termínů akce Modernizace ŽST Cheb budou termíny demontáže lávky upraveny tak, aby mohl být využit souběh výluk obou akcí na kolejích **11, 9a, 7a, 3, 1, 2, 4a a 6** v osobním kolejišti.

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU

INVESTOR STAVBY

MĚSTO CHEB
náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb



DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LÁVKY

ČASOVÝ POSTUP PRACÍ

r.f.o.

D.6
